

Beheer Openbare Ruimte 2023 zomerupdate

Update #4, Juli 2024
D/24/152386



gemeente
WOERDEN



Voor u ligt de zomerupdate Beheer Openbare Ruimte 2024 van de pijler BOR (beheer openbare ruimte) dat onderdeel is van team Realisatie & Beheer (R&B). In deze update kijken wij terug op de afgelopen maanden en geven we een vooruitblik naar de komende maanden. De toezegging is dat u tweemaal per jaar een update over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte ontvangt. Deze toezegging is nog eens bevestigd tijdens de politieke avond 'startnotitie Herijking openbare ruimte' van 25 april j.l.

Met de updates geeft de pijler BOR u informatie over de voortgang van het (groot) onderhoud en de ontwikkelingen binnen het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Het gaat dan over onder andere; implementatie van beleid in het beheer, areaalontwikkelingen, kwaliteitsmetingen, financiële resultaten, meldingen openbare ruimte, de onderhoudsplanning en voortgang. Zo brengen en houden wij u op de hoogte, bereiden u voor op en leggen wij verantwoording af over de resultaten van de beheeropgaven die u met ons afgesproken heeft.

In deze editie gaan we onder andere in op het effect van het natte weer op de meldingen, de resultaten van het onderhoud op de beeldkwaliteit, het Programma 'Herijking Openbare Ruimte' en eerste resultaten, formatieontwikkeling pijler BOR en de ontwikkelingen voor de verbetering van de samenwerking met teams Afval & Reiniging (A&R) en Wijkonderhoud.

In deze zomerupdate 2024 behandelen we in de volgende hoofdstukken de onderdelen van beheer openbare ruimte (BOR):

Pijler BOR: organisatie & ontwikkelingen

In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op de pijler BOR.

Beleid

In het hoofdstuk Beleid geven wij inzicht in de belangrijkste beleidsveranderingen die voor BOR van toepassing zijn. En hoe deze zijn of worden opgenomen in het beheer van de openbare ruimte.

Kwaliteit en Beleving


Hier geven wij inzicht in de resultaten op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte en de meldingsresultaten die door onze inwoners zijn gedaan.

Onderhoudsprogrammering

Hier nemen wij u mee in de voortgang van het jaarplan Openbare Ruimte wat bestaat uit locaties waar binnen twee jaar groot onderhoud of vervanging nodig is en uitgevoerd moet zijn.

1. Pijler BOR: organisatie & ontwikkelingen

Voordat we ingaan op de organisatie van de pijler BOR en de laatste ontwikkelingen is het goed te noemen dat het team Realisatie & Beheer samen pijler BOR (beheer en onderhoud), pijler Projecten ((her)bouw projecten) en pijler Strategie en Beleid het gehele team vormt (Figuur 1). Deze update gaat specifiek over de werkzaamheden van pijler BOR en geeft geen specifieke informatie over opgaven die vallen onder de pijler Projecten of de pijler Strategie en Beleid.



Figuur 1 organisatie team R&B

Ontwikkelingen

Het afgelopen halfjaar speelden er een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor de organisatie en activiteiten van de pijler BOR. De belangrijkste zijn:

- Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen teams Afval & Reiniging, Wijkonderhoud en Realisatie & Beheer.
- Formatie pijler BOR
- Programma 'Herijking Openbare Ruimte'

Samenwerkingsovereenkomst BOR (SOK)

Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is de pijler BOR eindverantwoordelijk. De teams Wijkonderhoud en Afval & Reiniging hebben een belangrijke rol bij de uitvoering hiervan en de inzameling van huisvuil.

Een goede samenwerking tussen de teams is daarom belangrijk om de kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen. Om de interne samenwerking verder te verbeteren zijn de drie teams de afgelopen maanden bezig geweest met het herzien van de onderlinge beheer- en uitvoeringstaken. Dit is vastgelegd in een SOK. Dit was nodig omdat op een aantal onderdelen niet duidelijk was wie het beheer organiseert en wie welke uitvoeringstaak had. Dit had invloed op de effectiviteit van de teams, de onderlinge samenwerking en uiteindelijk de beleving van onze inwoners. De verbetering van de samenwerking is een doorlopend proces. De teams blijven met elkaar in gesprek om knelpunten te bespreken.

Onderdeel van de verbeterde samenwerking is het besluit om de collega's van de pijler BOR nog vaker en regelmatig op het stadserf te gaan laten werken. Dit om de verbinding en samenwerking tussen beheer en uitvoering verder te verbeteren. Om dit goed mogelijk te maken worden de komende tijd nog wat praktische aanpassingen op het stadserf gedaan.

1. Pijler BOR: organisatie & ontwikkelingen

Formatie pijler BOR

In de Herfstupdate 2022 (D/22/065521) werd al beschreven dat actief wordt ingezet op het invullen van de vrijgekomen formatieruimte door vertrek van collega's. Hierna zijn in '23/'24 verschillende formatieplekken ingevuld met vaste collega's of met inhuur van externen.

Aan het einde van dit jaar en begin 2025 nemen opnieuw een aantal collega's afscheid of maken gebruik van regelingen om minder te kunnen werken. Er komt dus formatieruimte vrij. Naar aanleiding van het Programma 'Herijking Openbare Ruimte' en de 'nieuwe spelregels' die wij daarin met u hebben afgesproken, kan de formatiebehoefte van de pijler BOR wijzigen ten opzichte van de huidige formatie. Zo kan de herijking leiden tot andere taken, rollen of benodigde kwalificaties voor de pijler BOR. Om deze reden bekijken wij per vrijkomende formatieplek goed of invulling met vaste formatie kan of dat tijdelijke inhuur (in afwachting van de uitkomsten van de herijking) verstandiger is. Zo proberen wij flexibiliteit te creëren die het mogelijk maakt om snel vaste collega's aan te trekken die de competentie bezitten waar de uitkomst van de herijking om vraagt.

Programma 'Herijking Openbare Ruimte'

Op 23 mei j.l. heeft u unaniem het raadsvoorstel 'startnotitie herijking openbare ruimte' (D/24/132681) vastgesteld. Dit betekent dat het Programma 'Herijking Openbare Ruimte' mag starten. De pijler BOR heeft een belangrijke inhoudelijke rol in het doorlopen van de herijking. Dit betekent dat er de komende tijd veel werk verzet moet worden. Tegelijkertijd moet de spreekwoordelijke 'winkel' ook open blijven. De pijler BOR neemt daarom een aantal organisatorische maatregelen om dit te bereiken. U kunt denken aan het inhuren van tijdelijk personeel voor taken waarvoor dat mogelijk en noodzakelijk is. En tijdelijk geen nieuwe en complexe beheervraagstukken te starten of aan te nemen. De pijler BOR heeft een groot belang bij de uitkomsten van de herijking en wil dan ook graag meewerken om het samen met het u een succes te maken.

2. Beleid

In het hoofdstuk Beleid geven we inzicht in de belangrijkste beleidsveranderingen die voor BOR van toepassing zijn of gaan worden en wat deze (kunnen gaan) betekenen voor het beheer van de openbare ruimte (Figuur 2).

In het afgelopen half jaar is er geen nieuw beleid aangenomen dat grote invloed heeft of gaat krijgen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Wel zijn er een aantal beleidsplannen in ontwikkeling waar de pijler BOR meekijkt in de uitwerking, als voorbereiding op proces- en beheerwijzigingen. Ook maken wij vanuit technisch beheer oogpunt de consequenties en risico's inzichtelijk, zodat de beleidsmakers hier hun afwegingen op kunnen maken voordat u om advies of besluiten wordt gevraagd.



Figuur 2 beleidsvelden met een relatie beheer openbare ruimte

Beleid Ecologie en herziening Groenblauw omgevingsplan

Middels de Kadernota 2025 is door de pijler Strategie en Beleid budget aangevraagd voor nieuw beleid Ecologie en aangepast Groenblauw beleid. Nieuw beleid kan een grote waarde en impact hebben op het beheer van de openbare ruimte in de komende jaren. Het zal vragen om andere en gerichtere onderhoudsmethoden. Het is nu nog te vroeg om aan te geven welke dit precies zijn en wat daarvan de gevolgen zijn voor de onderhoudscontracten en de uitvoeringsorganisatie.

Beleidsplan Openbare Verlichting

Ook voor openbare verlichting is nieuw beleid in de maak. Dit heeft een tijd stilgelegen door onderbezetting. Nu dit is opgelost wordt hier voortvarend aan gewerkt. De pijler BOR is op dit moment inhoudelijk betrokken om de gevolgen voor beheer van de eerste beleidskeuzes inzichtelijk te maken. Dat is input voor de beleidsmakers om te toetsen of de verschillende voorgestelde beleidskeuzes voor de pijler BOR beheersbaar zijn en binnen de door u meegegeven kaders vallen. Daarna volgen aanpassingen en toetsing tot het beleidsvoorstel gereed is om ter besluitvorming te worden aangeboden. Door aangehaakt te zijn kunnen wij ons voorbereiden op de beheerveranderingen die nodig zijn. Zo kan beleid snel tot uitvoering komen na besluitvorming.

2. Beleid

Beeldkwaliteit

Sinds de Strategische Heroriëntatie 2020 heeft de gemeente het beheer op beeldkwaliteit volgens de CROW systematiek losgelaten en beheren wij alleen op het thema veilig.

Toch is een deel van het onderhoud nog op beeldkwaliteit. Het gaat dan om het verzorgend onderhoud wat bestaat uit maaien, onkruidbestrijding, vegen, kleine reparaties, enzovoorts. Dit werk zit in het zogeheten Gevel tot Gevel contract (GTG).


Vanaf 1 februari dit jaar is dit contract opnieuw ingegaan voor tenminste 3 jaar met een optie 3 keer met 1 jaar te verlengen tot een totaal van 6 jaar.

Om het contract te controleren en het algehele resultaat van het verzorgend onderhoud inzichtelijk te maken wordt er door ons elk kwartaal een beeldkwaliteitsmeting gedaan. Over het resultaat per kwartaal en de ontwikkeling over de langere termijn rapporteren wij in de zomer- en winterupdates.

In deze rapportage worden de eerste twee kwartalen van 2024 gerapporteerd. Als referentie wordt beeldkwaliteit B – het oude beleidskader – gebruikt. Belangrijk om te weten is dat de kwaliteitsnorm 10% afwijking van het beleid toestaat, dus als minimaal 90% op B scoort, voldoet dat aspect aan het toetskader.

Resultaat eerste kwartaal 2024

In het eerste kwartaal lag 4% van de meetwaarden onder het 'B'-niveau, dit is minder dan 10%. Daarmee voldeed de openbare ruimte aan het oude kader en de huidige eisen in het GTG. In de meting valt op dat de verzorging van de (civiele) kunstwerken (bruggen en tunnels) tegen de ondergrens van 10% afwijking aanlopen (Figuur 3).

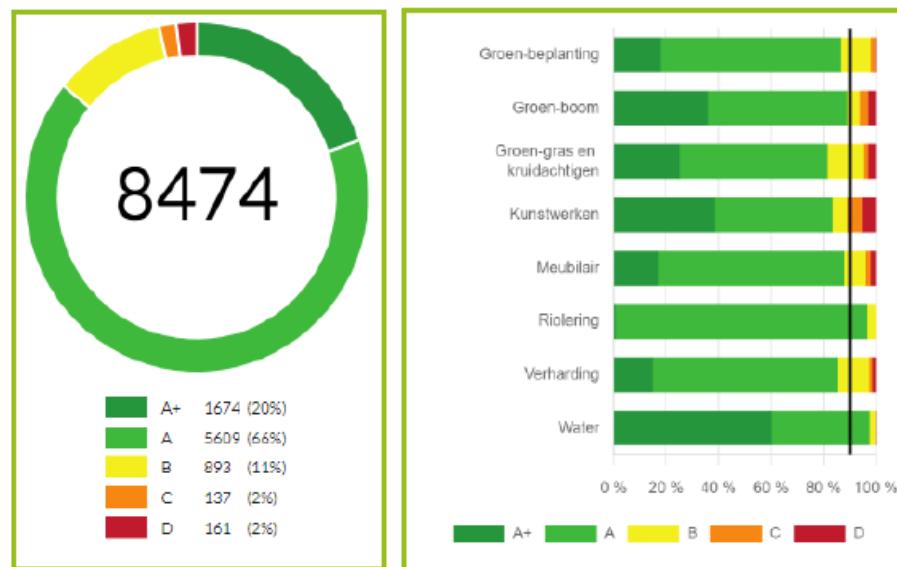


Figuur 3 beeldkwaliteit scores 2024, 1e kwartaal

2. Beleid

Resultaat tweede kwartaal 2024

In het tweede kwartaal lag 7% van de meetwaarden onder het 'B'-niveau. Ook in die periode voldeed het aan het oude beleidskader en aan de contracteisen het GTG. In Q2 valt wel op dat de verzorging van de riolering meer dan 10% onder niveau scoort (Figuur 4) en dat de verzorging van meubilair onder niveau dreigt te duiken.

De afwijking bij riolering is geconstateerd op het schoonhouden van de inlaat van kolken (putten). Er is niet op tijd of voldoende geveegd. Hierbij merken wij op dat door de extreme regenval zich veel vuil verzameld heeft en tot pieken in vervuiling heeft geleid. Ook constateren wij dat er meer blad valt dan andere jaren. Het is aan de aannemers om hier op in te spelen en mag geen reden zijn om sterk af te wijken van de kwaliteitseisen. Daarom is hierop door contractmanagement gestuurd om dit op orde te brengen en te houden. De volgende metingen geven inzicht of wij hierin zijn geslaagd.

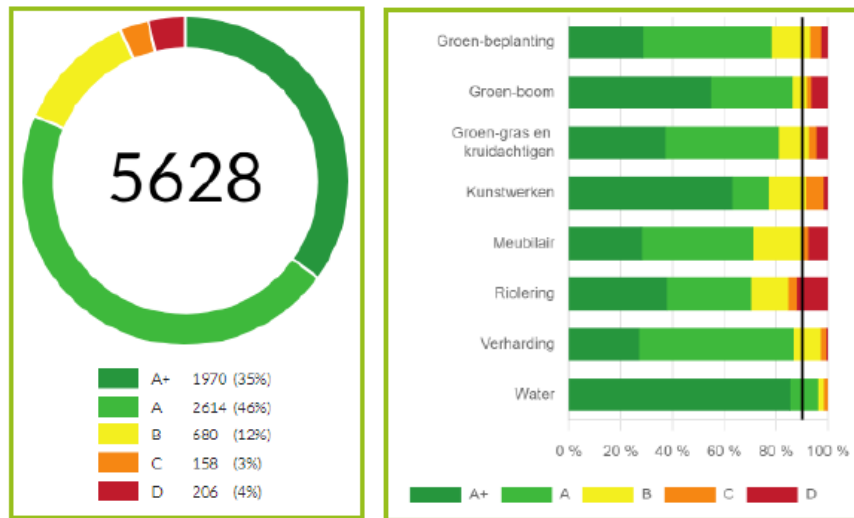

Figuur 4 beeldkwaliteit scores 2024, 2e kwartaal

2. Beleid

Beleving


De verzorgingsstaat van de openbare ruimte heeft invloed op hoe onze inwoners de openbare ruimte beleven. De meldingen openbare ruimte zijn een belangrijke indicator hiervoor. Wanneer er veel meldingen zijn over de kwaliteit van onderhoud dan geeft dit aan dat de kwaliteit als onacceptabel wordt ervaren. Dit kan worden vertaald in een negatieve beleving van de openbare ruimte. Het is daarom belangrijk om als pijler BOR de ontwikkeling van meldingen goed te monitoren en, waar nodig, tijdig bij te sturen op achterliggende redenen van de meldingen. Soms is bijsturing niet noodzakelijk omdat de openbare ruimte die negatieve wordt ervaren wel voldoet aan de gewenste kwaliteit. De melder krijgt in dat geval hierover een toelichting.

Meldingen

Dit jaar zijn er tot 1 juli 8.476 meldingen openbare ruimte afgehandeld. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode nog 7.629. Dit jaar zijn er in het eerste half jaar 847 meer meldingen gedaan wat neerkomt op een stijging van ruim 11%.

91% van de meldingen in 2024 is binnen 48 uur (afgesproken termijn) in behandeling genomen. Dit was in 2023 nog 85% van de meldingen. Dit is een goede ontwikkeling, maar wij blijven streven naar meer.


Als we kijken naar het verschil tussen het totaal van meldingen in 2023 versus 2024, dan valt op dat de verschillen (Figuur 5) vooral te vinden zijn in meldingen over afval (incl. inzameling), overlast (ook (fout)parkeren) en riool.

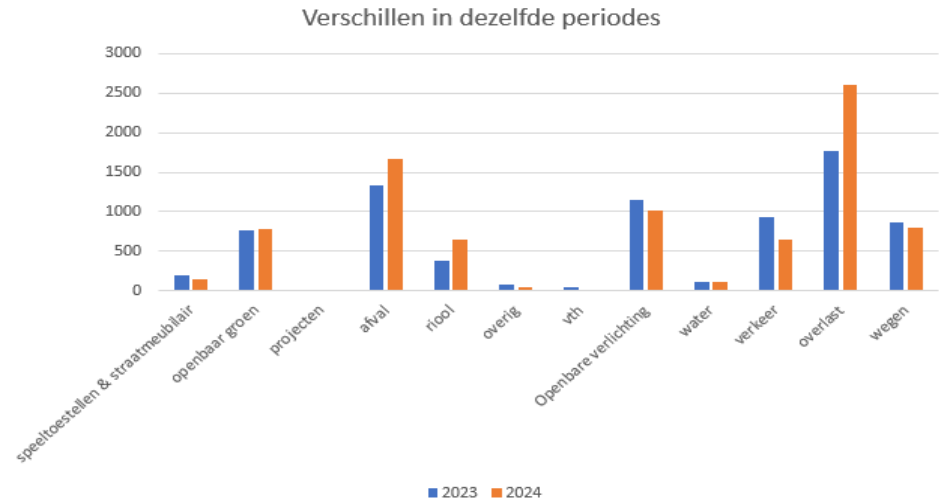


Figuur 5 meldingen verloop per categorie in de eerste 6 maanden van de jaren '23 en '24

2. Beleid

Voor de verschillen in de categorieën afval en overlast is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Voor de categorie riool is die er wel. In mei van dit jaar hebben we te maken gehad met extreme buien. Hierdoor is er op meerdere plaatsen wateroverlast ontstaan wat zorgde voor veel meldingen. Hierdoor kwam het totaal aantal meldingen over het riool in de eerste 6 maanden van dit jaar veel hoger uit dan in 2023. Totaal waren het 266 melding in de maand mei 2024 wat er 194 meer zijn dan in de maand mei van 2023. In de figuren 6 & 7 zijn de verschillen in de maand mei goed terug te zien. Hier kunt u ook de verschillen van alle overige categorieën zien.

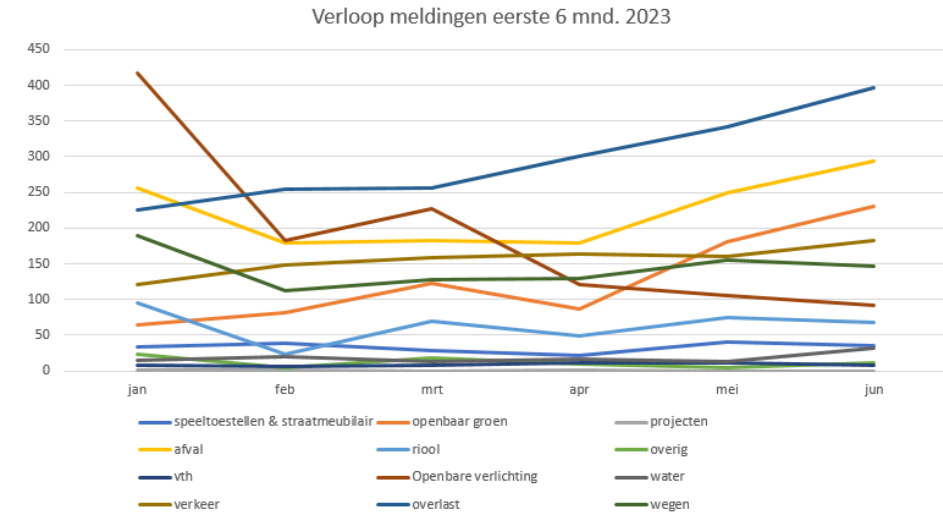

Figuur 6 verloop meldingen eerste 6 maanden in 2023

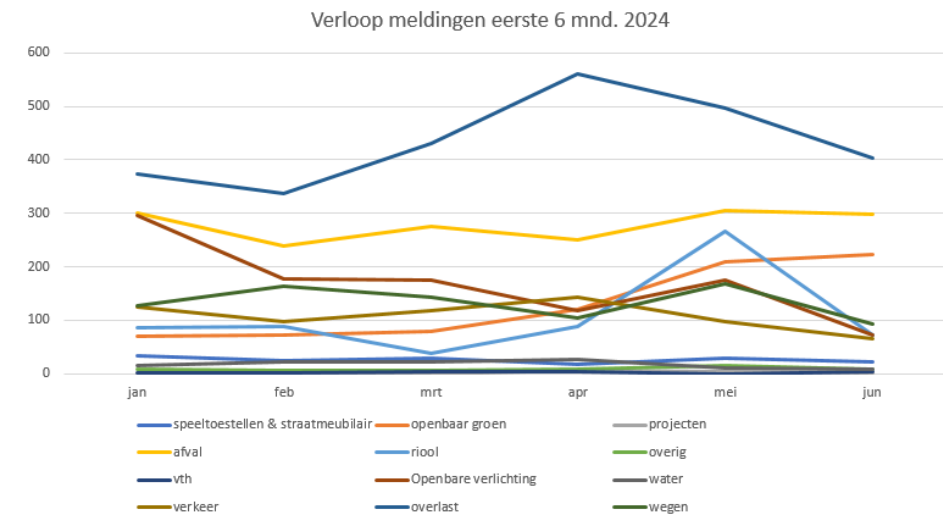

Figuur 7 verloop meldingen eerste 6 maanden in 2024

6. Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte

De onderhoudsprogrammering van 2024 is uitgewerkt in het jaarplan openbare ruimte. Hierin staan alle groot onderhoud werkzaamheden en vervangingen die in 2024, door of in opdracht van de pijler BOR, moeten worden uitgevoerd. In de volgende pagina's 11 t/m 14, vindt u het jaarplan en een overzicht van de voortgang en eventuele bijzonderheden.

De werkzaamheden zijn afgestemd op de begroting zoals die voor het jaar van uitvoering is vastgesteld. Om die reden wordt het jaarplan altijd pas in de maanden november t/m januari definitief gemaakt. In enkele gevallen komen er gedurende het jaar extra werkzaamheden bij. Dit kan alleen als het gaat om risico's op de veiligheid en er binnen 6 maanden een ingreep nodig is. De dekking moet dan komen via besluiten in de daarvoor bedoelde P&C momenten of een apart raadsbesluit. Bij calamiteiten en acuut noodzakelijke ingrepen waarvoor geen dekking meer beschikbaar is, volgt altijd een kennisgeving overschrijding in de najaarsrapportage of jaarrekening.

Het rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden uit het jaarplan is een belangrijk onderdeel van deze zomerupdate. Hiermee krijgt u inzicht in dat we ook nakomen wat we beloven. En als wij het niet halen, dan kunnen wij u hier uitleggen waarom dat zo is. De financiële kant van de uitvoering kunt u niet terugvinden in het jaarplan en ook niet in de zomerupdate. De financiële rapportage(s) vindt u terug in de verschillende P&C cyclus documenten (o.a. Par. kapitaalgoederen IBOR).

6. Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte

Legenda			
	Uitvoering ligt op schema.		Uitvoeringsverwachtingen moeten mogelijk bijgesteld worden.
	Uitvoering ligt niet op schema.		Uitvoering is afgerond.

Riool				
Kern	Locatie	Toelichting	Voortgang	Opmerking
Kamerik	Sportvelden	Groot onderhoud afwatering		Afgerond
	Van Teylingenweg	Aanbrengen minizuivering		Geen bijzonderheden
Woerden	Rembrandtlaan	Groot onderhoud riolering		Start Q3
	Veldbloemenlaan	Groot onderhoud riolering		Vorbereiding duurt langer dan verwacht.
	Meerdere locaties	Groot onderhoud minigemalen		Geen bijzonderheden

Groen				
Kern	Locatie	Toelichting	Voortgang	Opmerking
Harmelen	Diverse locaties	Vervangingen van bomen en verbetering van groeiplaatsen		Geen bijzonderheden. Zie uitvoerinsplannen op www.treemark.nl .

6. Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte

Civiele Kunstwerken				
Kern	Locatie	Toelichting	Voortgang	Opmerking
Woerden	Cattenbroeckerplas	Oeverherstel	✓	Afgerond
	Cromwijckerpark	Groot onderhoud en vervanging bruggen	✓	Afgerond
	Molenvlietbrug	Vervangen brug	👉	Meer onderzoek nodig, uitvoering doorgeschoven naar 2025.
	Polanerbaanbrug	Vervangen twee bruggen	👉	Relatie met ontwikkeling ziekenhuisterrein. On hold in afwachting van uitspraak ruimtelijke beleid over noodzaak van deze bruggen voor de toegankelijkheid van dit gebied ook met toekomst in achterhoofd.
	Troostlaan	Groot onderhoud brug	👍	Geen bijzonderheden
	Park Bredius	Onderhoud bruggen	👍	In goed overleg met en naar tevredenheid van stichting Landgoed Bredius.
	De Nes	Oeverherstel	👍	Er zijn meer en complexere reparatiewerkzaamheden nodig dan verwacht. Er wordt een overschrijding verwacht, die wordt verwerkt in de najaarsrapportage.
	Geestdorp	Vorbereiding groot onderhoud Groepenbrug	👍	Vorbereidingswerk voor uitvoering onderhoud in 2025.
	Overtoom	Vorbereiding groot onderhoud Overtoom brug	👍	Vorbereidingswerk voor uitvoering onderhoud in 2025.
	De Zaan	Vorbereiding groot onderhoud Kademuur	👎	Vorbereidingswerk voor uitvoering onderhoud in 2025 moet nog starten.
Harmelen	Oude Rijn Jaagpad	Groot onderhoud bruggen	👎	Nog niet gestart
	Prinsenhof	Vervanging Prinsenhofbrug	👍	Geen bijzonderheden
Zegveld	De Haak	Aanbrengen valbescherming (leuning)	✓	Afgerond
	Broeksloot Zegveld	Vervangen brug	✓	Afgerond
	Milandweg	Aanbrengen faunavoorziening	✓	Afgerond
	Vaartuigenlaan	Groot onderhoud Vaartuigenlaanbrug	✓	Extra toegevoegd in 2024 n.a.v. constatering afwijkingen
	Barwoutswaarder	Groot onderhoud Barwoutswaarderbrug	👍	Extra toegevoegd in 2024 n.a.v. constatering afwijkingen
	Molenvlietpark	Groot onderhoud Molenvlietpark	👍	Extra toegevoegd in 2024 n.a.v. constatering afwijkingen

6. Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte

Openbare verlichting en installaties				
Kern	Locatie	Toelichting	Voortgang	Opmerking
Harmelen	Prinsenhof	Vervangen armaturen	✓	Afgerond
	Nassaupark	Vervangen armaturen	✓	Afgerond
	Wilhelminalaan e.o.	Vervangen masten en armaturen	✓	Afgerond
Kamerik	De Hild	Vervangen armaturen	✓	Afgerond
Woerden	Gedempte Binnengracht	Vervangen masten en armaturen	✓	Afgerond
	Prinsenlaan/Honthorststraat/Rijnkade	Vervangen masten en armaturen	👍	Geen bijzonderheden
	De Zoom	Vervangen masten en armaturen	✓	Afgerond
	Eikenlaan e.o.	Vervangen armaturen	✓	Afgerond
	Oudelandseweg en Bredius	Vervangen masten en armaturen	✓	Afgerond
	Staatsliedenkwartier Zuid	Vervangen armaturen	✓	Afgerond
	Julianastraat/Prins Hendrikkade	Vervangen masten en armaturen	✓	Afgerond
	Hobbemastraat	Vervangen masten en armaturen	✓	Afgerond
	Sierkersstraat e.o.	Vervangen masten en armaturen	👎	Moet nog starten
	Van der Valkbouwmanlaan	Vervangen masten en armaturen	✓	Afgerond
	Madridlaan & Helsinkilaan	Vervangen masten en armaturen	✓	Afgerond
	Cattenbroekerdijk	Vervangen masten en armaturen	✓	Afgerond
	Molenvlietpark	Vervangen masten en armaturen	✓	Afgerond
	Schilderskwartier (Noord-west)	Vervangen masten	✓	Afgerond
	Singel	Vervangen masten	👍	Geen bijzonderheden
	Iepenlaan	Vervangen masten	✓	Afgerond
Zegveld	Nieuwstraat/Julianastraat	Vervangen masten en armaturen	✓	Afgerond

6. Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte

Speelvoorzieningen en straatmeubilair				
Kern	Locatie	Toelichting	Voortgang	Opmerking
Woerden	Gedempte Binnengracht	Vervanging speelvoorziening		Geen bijzonderheden.
	Bekenlaan	Vervanging speelvoorziening		Geen bijzonderheden.
	Kretakade	Groot onderhoud speelvoorziening		Geen bijzonderheden.
	Oeralstraat (Margrietschool)	Vervanging speelvoorziening		Geen bijzonderheden.
	Defensie-eiland	Aanbrengen speeltoestel		Afgerond
	Steinhagenseweg	Groot onderhoud speelvoorziening		Geen bijzonderheden.
	Keizershof	Groot onderhoud speelvoorziening		Geen bijzonderheden.
	Constantijnschool	Groot onderhoud speelvoorziening		Geen bijzonderheden.
	Willem Alexanderhof	Vervanging speelvoorziening		Onvoldoende dekking uitvoering doorgeschoven naar 2025.
	's Gravensloot	Groot onderhoud zakpaal		Afgerond
	Rijnstraat	Groot onderhoud zakpaal		Afgerond
	Exercitieveld	Groot onderhoud hekwerk		Afgerond
	Station en haven	Vervanging bebordingen		Geen bijzonderheden.
	Binnenstad	Vervanging bebordingen		Afgerond
Kamerik	Mijzijde	Aanbrengen speeltoestel		Geen bijzonderheden.
Zegveld	Middenweg	Vervanging watertappunt		Geen bijzonderheden.

6. Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte

Verharding				
Kern	Locatie	Toelichting	Voortgang	Opmerking
Harmelen	Ambachtsheerelaan	Vervanging verharding (voetpaden)	✓	Afgerond
Woerden	Rietveld	Vervanging verharding (fietspad)	👉	Nog niet gestart.
	Molenvliet- WTC	Groot onderhoud verharding	👉	Nog niet gestart.
	Molenvliet-Cromwijckpark	Vervanging verharding	👍	Geen bijzonderheden.
	Molenvliet-Molenvlietpark	Vervanging verharding	👍	Geen bijzonderheden.
	Kattegat	Vervanging verharding	👉	Doorgeschoven naar 2025.
	Hollandbaan/Gildenweg	Groot onderhoud verharding	👍	Geen bijzonderheden.
	Centrumring	Groot onderhoud verharding	👍	Geen bijzonderheden.
	De Zoom	Vervanging verharding	👍	Geen bijzonderheden.
	Waardsedijk	Groot onderhoud verharding	✓	Afgerond
	Boerendijk	Groot onderhoud verharding (fietspad)	✓	Afgerond
	Korenmolenlaan	Groot onderhoud verharding	👍	Geen bijzonderheden.
	Nieuwstraat	Vervanging verharding	👉	Nog niet gestart.
Zegveld	Oude Meije	Groot onderhoud verharding	✓	Afgerond
